



PROPUESTA

ETAPA 1 - SECTOR 5

La determinación de este sector como prioritario, se debe a la necesidad de resolver los desajustes pluviales de escurrimiento superficial en calle Belgrano, en el tramo comprendido entre calle Zaha Hernandez y Ambedida Argentina. Para dicha obra existe el proyecto ejecutivo con sus respectivos estudios hidráulicos, líneas de escurrimiento, cuencas y subcuencas.

ETAPA 1 - SECTOR 3

En este sector del polígono de intervención es posible llevar adelante la ejecución de cordón cuneta y badenes. La cuenca en la que esta el área a intervenir, atraviesa el Barrio "La Merced" que al no contar con cordones y cunetas, las veredas se han ido erosionando quedando por debajo del nivel de calle, generando anegamientos y deposición de sedimentos que son arrastrados desde los campos linderos, acarreado el respectivo riesgo para la salud de la población y ambiente.

Por otro lado la accesibilidad al barrio que ha quedado aislado brindaría una conectividad y continuidad de la trama:
 15 cuadras de cuneta de 1,00m mas cordón de 0,20= 1,752m
 10 Cuadras de cuneta de 0,60m mas cordón de 0,20= 1,020m

ETAPA 1 - SECTOR 1

El mejoramiento de la red vial en este sector mediante la ejecución de cordón cuneta y baden, permitirá la accesibilidad de la población del barrio al centro de salud, como así también será un aporte necesario para la transibilidad del mismo los días de lluvia:
 18 cuadras de cuneta de 1,00m mas cordón de 0,20= 3,200m

ETAPA 2 - SECTOR 1 Y 2

En esta etapa para realizar el completamiento y mejorado se proyecta ejecutar:
 42 cuadras de cuneta de 0,60m mas cordón de 0,20= 7,470m


ETAPA 2 - SECTOR 4

En esta etapa para realizar el completamiento y mejorado se proyecta ejecutar:
 13 cuadras de cuneta de 0,60m mas cordón de 0,20= 2,314m

ETAPA 2 - SECTOR 5

En esta etapa para realizar el completamiento y mejorado se proyecta ejecutar:
 3 cuadras de cuneta de 1,00m mas cordón de 0,20= 534m

SECTORIZACIÓN

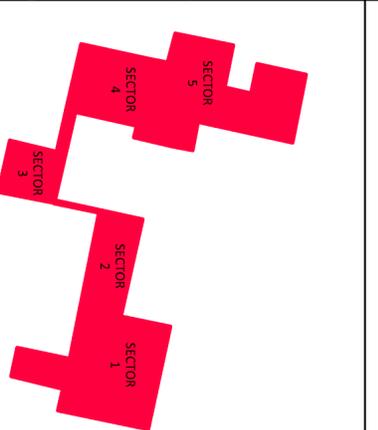

Municipalidad de Diamante
 Entre Ríos

Programa: **PROMEBA**

Ubicación: **DEPTO. DIAMANTE**

Plano de red vial. Propuesta mejorado

REFERENCIAS

- Polígono de intervención
- EXISTENTE**
- Calles asfaltadas
- Calles Adoquinadas
- Calles con mejorado de broza
- Calles con cordón cuneta
- PROYECTADO**
- Cordón cuneta proyectado de 1,00m
- Cordón cuneta proyectado de 0,60m

NOTA

El porcentaje de calles con mejorado de broza es alto. Pero la topografía del departamento (ver plano anexo de perfiles transversales y longitudinales), genera escurrimientos de los desagües pluviales por gravedad, que limpia el material con el que se mejora la red vial. Existen sectores en los que es imprescindible ejecutar cordón cuneta y baden, para direccionar el agua de lluvia y evitar la sedimentación en los sectores bajos.

| | |
|--|----------------------|
| | |
| Municipalidad de Diamante | |
| Entre Ríos | |
| Programa: PROMEBA | |
| Ubicación: DEPTO. DIAMANTE | |
| Plano de red vial. Propuesta mejorado | |
| RESPONSABLE TÉCNICO | RESPONSABLE PROGRAMA |
| RESPONSABLE MUNICIPAL | PRESIDENTE MUNICIPAL |
| Fecha: Mayo / 2014 | Escala: |
